

LEGENDA:

- Lampeggiante
- Delimitazione area di cantiere con "NewJersey" bianchi e rossi
- Delimitazione area di cantiere con "Rete Brenta"
- Delimitazione con "Rete Brenta" e rete rossa di cantiere


Fase 2

DEMOLIZIONE MANUFATTI ESISTENTI

Sicurezza: "Rete Brenta" di recinzione ai margini dell'area di intervento. Adeguata segnaletica stradale provvisoria. Recinzione provvisoria con rete rossa di cantiere della zona interessata dalle demolizioni che avverranno mediante rovesciamento per trazione o spinta.

Lavorazioni previste: fase di demolizione mediante trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere con allontanamento degli operai dalla zona interessata. Allontanamento delle macerie. Demolizione di parte interrata con successivo ripristino come da elaborati grafici di progetto con idoneo materiale di riempimento e formazione di rilevato.

Area di intervento: ca. 360 mq

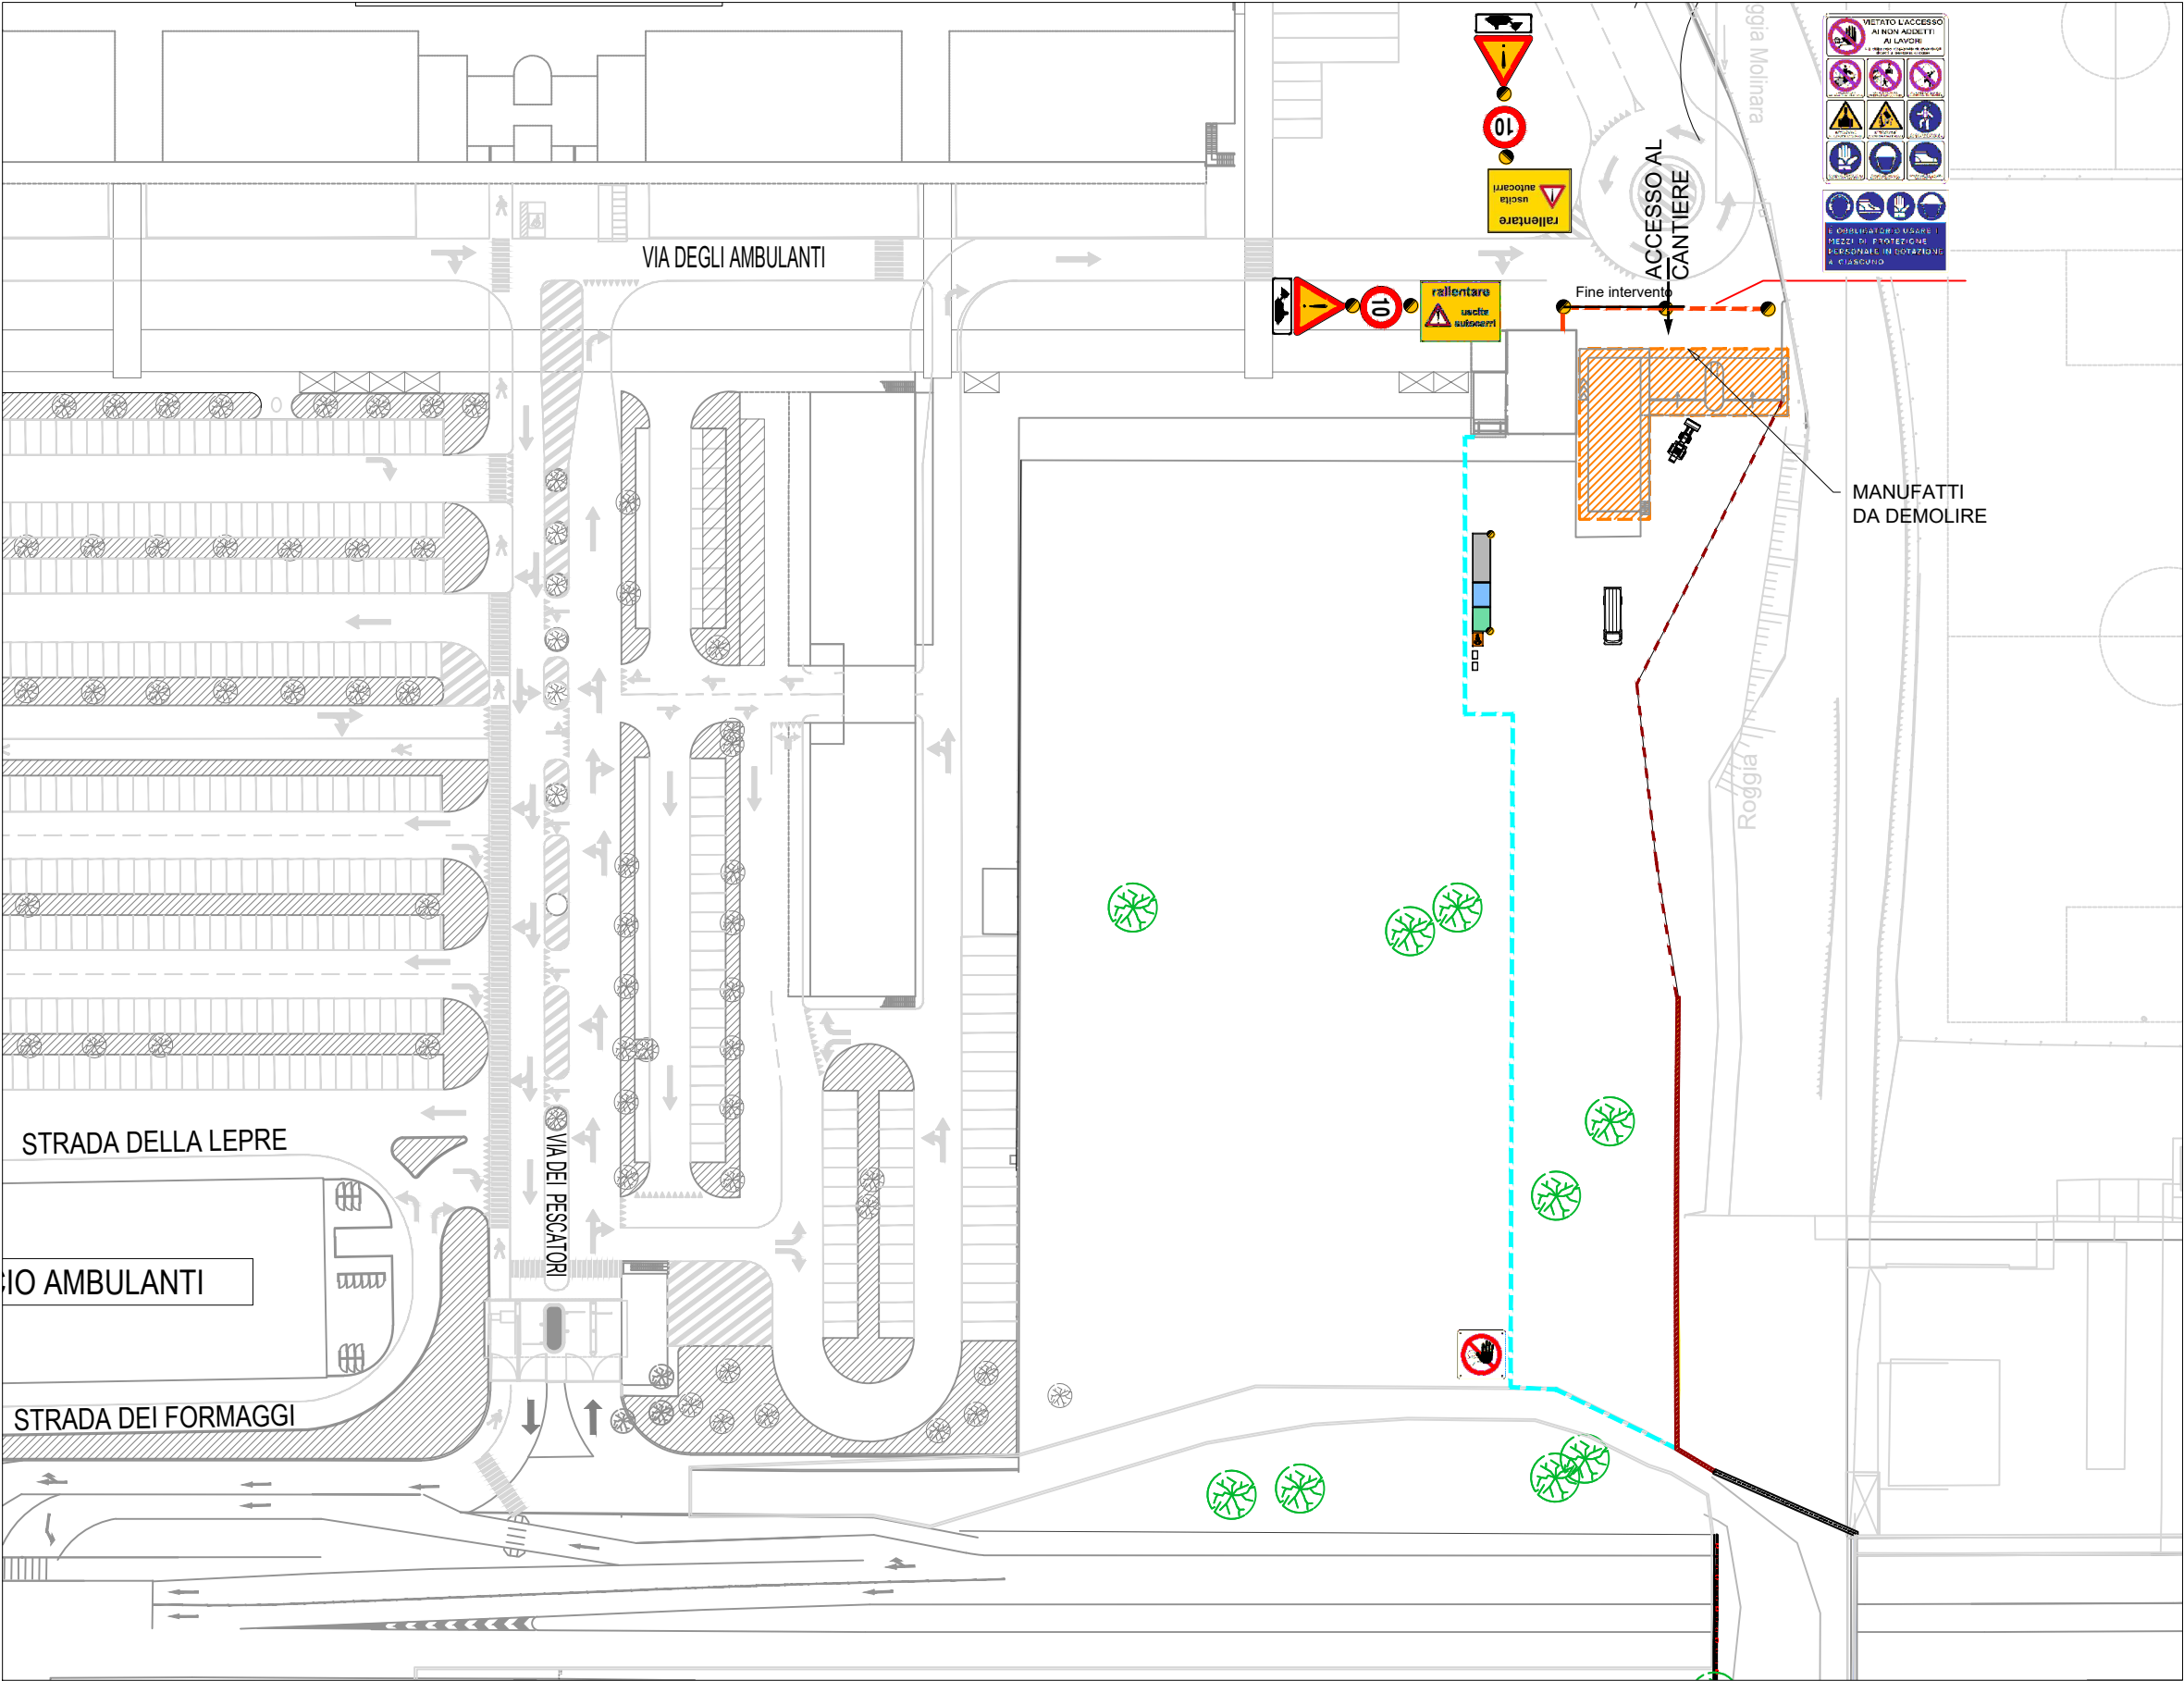

Sogemi

Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingresso di Milano
Via C. Lombroso 54, Milano
P. IVA 03516950155

**Razionalizzazione della
viabilità dei mercati gestiti da
SOGEMI**

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

C - COLLEGAMENTO TRA IL MERCATO ORTOFRUTTA E
AREA IFC - Fase 2

| REV. | DATA | Progettista | Controllato | Approvato |
|------|----------|------------------------------|-------------|------------|
| 01 | 08/10/19 | Geom. Fontana Ing. Scopel | Ing. Valle | Ing. Valle |



SCALA 1:1000

documento n.

SIC

C2
